

太陽光パネルの価格高騰と納期遅延に関する緊急調査結果

一般社団法人日本 PV プランナー協会

昨今の太陽光パネルの価格高騰が、太陽光発電事業に与えている影響を把握するために、「太陽光パネルの価格高騰と納期遅延に関する緊急調査」を Web アンケート形式で実施しましたので、その結果を公表します。

【調査の概要】

実施期間：2021年11月5日～12月4日


調査方法：Web フォームによる回答

回答件数：108 件

【回答者の属性】

属性をお知らせください


108 件の回答



【調査結果の概要】

今回の緊急調査により、従来は3ヶ月以内だったとする回答が89%を占めていた太陽光パネルの納期が、現在は3ヶ月以上に及ぶ事例が46%、更に納期の回答が得られない（未定）とする回答が30%以上に達しています。

これまでの通常の納期はどのくらいでしたか
108件の回答

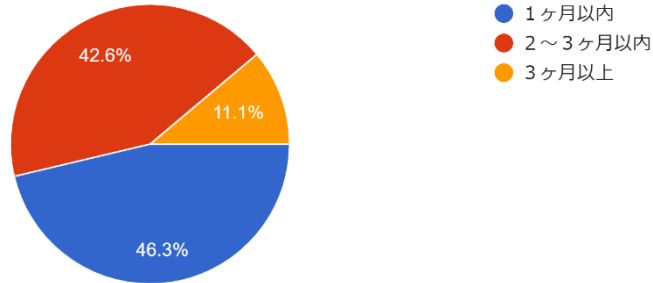

今現在、年内に発注した場合の納期はどのくらいですか
108件の回答




そして、来年の見通しについても、**従来通りの納期に戻るとする回答は5%程度**にとどまり、**3ヶ月以上・半年以上・見通せないという回答が90%超**を占めました。

来年の納期はどのようになると感じていますか
108件の回答




価格については、2020年比で30%以上上昇したという回答が34.3%となり、15%以上増えたという回答を含めると65.8%の事業者で大幅な価格上昇に見舞われていることが明らかになりました。2020年には2019年比で下がったまたは変わらないとする回答が66.7%だったことを踏まえると、今年は太陽光パネルの価格を巡る異例の状況が生じていることが分かります。

2021年と2020年の価格変動について、対前年比でどの程度価格が変わりましたか
108件の回答

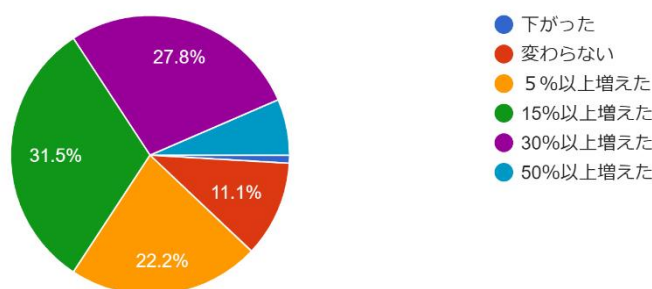


2020年と2019年の価格変動について、対前年比でどの程度価格が変わっていましたか
108件の回答

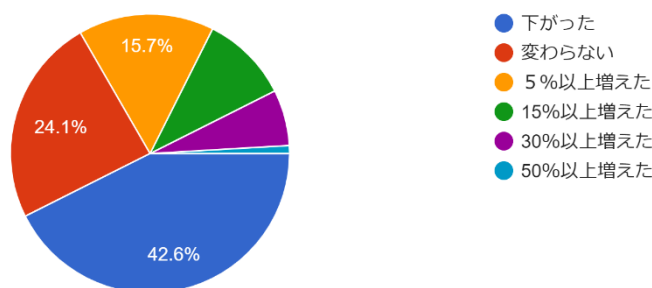


また、価格上昇に見舞われている回答者のうち48.9%がFITの事業計画認定申請に影響があったと回答しており、そのうち79.7%の事業者が事業計画認定申請数を減らしたり、申請そのものを行わなかったりしたと回答しており、太陽光パネルの価格上昇がFIT制度にも影響を及ぼしていることが明らかになりました。

「価格が上昇した」と回答した方にお伺いします。2...年度のFIT認定申請における影響はありましたか
90 件の回答

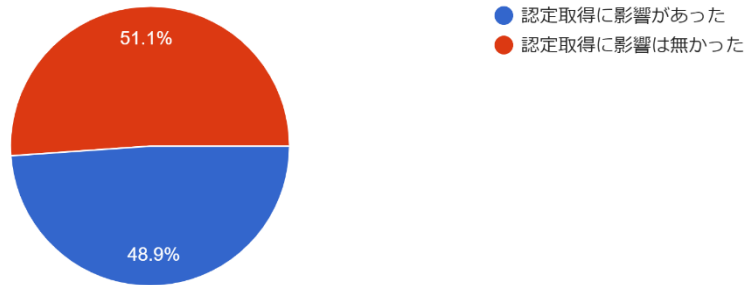


「認定取得に影響があった」と回答した方にお伺い...す。認定申請数にどのような影響がありましたか
59 件の回答

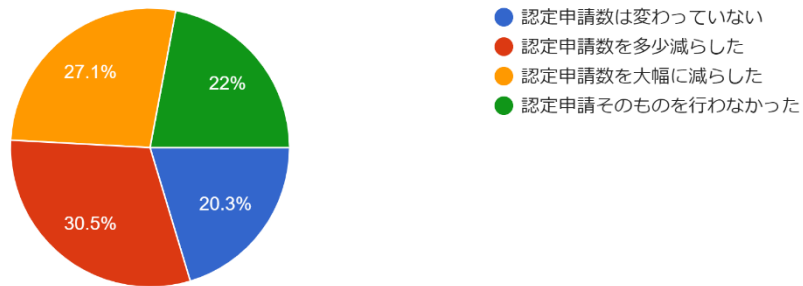

来年の価格の見通しについては、**現在よりも値上がりする**とした回答が **75.9%**を占め、
今後も値上がりが続くという見通しを持っている事業者が多いことが明らかになりました。

来年の価格はどのようになると感じていますか
108 件の回答

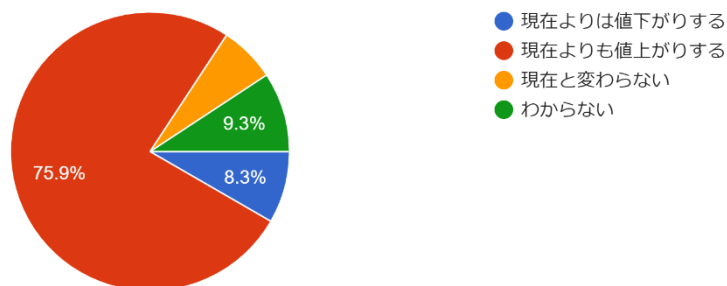

【調査結果の分析】

これまで FIT 制度や FIP 制度の政策検討にあたっては、太陽光発電資材の価格は常に低

2021/12/06

下していくことが暗黙の了解となっていました。今年、太陽光パネルの価格上昇によって事業計画認定の申請も影響していることが明らかになったことで、その前提条件の見直しを余儀なくされることとなります。また、太陽光パネルの納期が従来の倍以上の期間に延び、その解消が見通せないという状況が生じていることについては、3年ルールや各種補助制度の完了期日を見直す必要もあるでしょう。いずれも、国際的な市場環境の変化によって生じている問題のため、個別の事業者では対応不可能な事象であることから、この現状を踏まえた迅速な政策対応が求められます。

【本件問い合わせ先】

〒102-0084

東京都千代田区二番町 3-10 白楊ビル 2 階

一般社団法人日本 PV プランナー協会 事務局

事務局長 大槻 浩之

電話 03-6256-9970

E-mail otsuki@pv-planner.or.jp
